Приложение №1 к Договору

АНО РСИ

СОГЛАСОВАНО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_____

Календарно-сетевой график
по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: 9 мая ул., влд. 28»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АНО "РСИ"

_____ И.Ф. Хайрутдинов
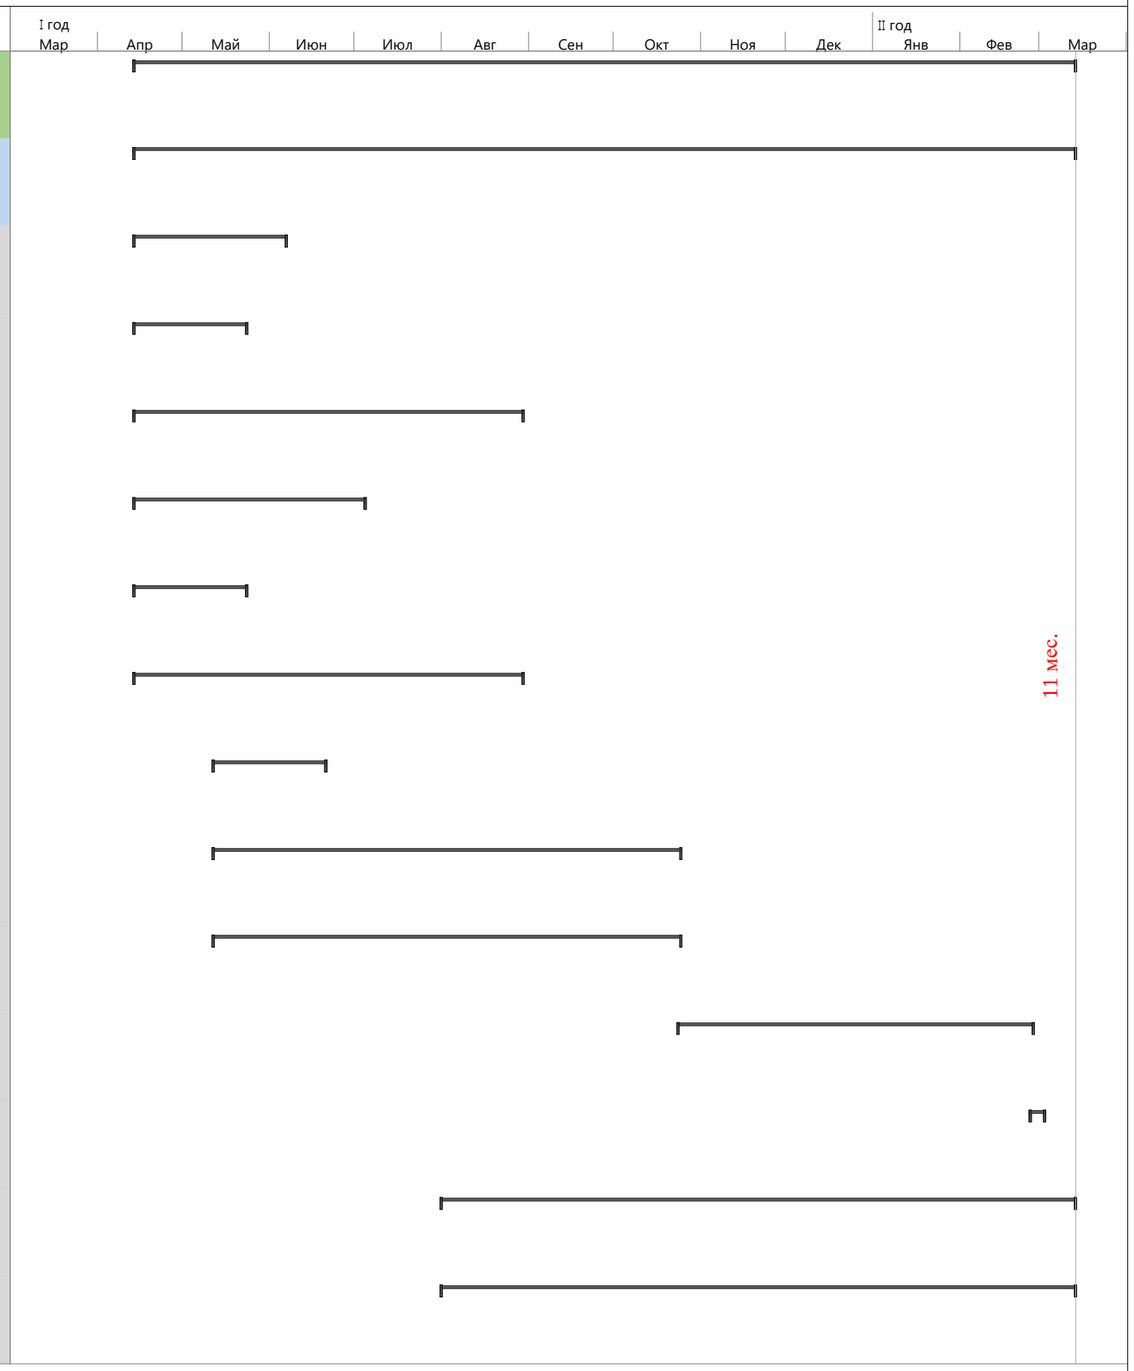
Ид.	Перечень работ	Начало	Окончание	Длительность
1	**Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: 9 мая ул., влд. 28**	**Дата заключения Договора**	**Не позднее 333 календарных дней с даты заключения Договора**	**333 дня**
1.1	**Проектно-изыскательские работы**	**Дата заключения Договора**	**Не позднее 333 календарных дней с даты заключения Договора**	**333 дня**
1.1.1	**Исходные данные для проектирования**	**Дата заключения Договора**	**Не позднее 60 календарных дней с даты заключения Договора**	**60 дней**
1.1.2	**Архитектурно-планировочные решения (АПР)**	**Дата заключения Договора**	**Не позднее 40 календарных дней с даты заключения Договора**	**40 дней**
1.1.3	**Инженерные изыскания**	**Дата заключения Договора**	**Не позднее 140 календарных дней с даты заключения Договора**	**140 дней**
1.1.4	**Технические условия**	**Дата заключения Договора**	**Не позднее 80 календарных дней с даты заключения Договора**	**80 дней**
1.1.5	**Задание на проектирование**	**Дата заключения Договора**	**Не позднее 40 календарных дней с даты заключения Договора**	**40 дней**
1.1.6	**Архитектурно-градостроительные решения (АГР)**	**Дата заключения Договора**	**Не позднее 140 календарных дней с даты заключения Договора**	**140 дней**
1.1.7	**Разработка и согласование перечня немонтируемого оборудования**	**Не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора**	**Не позднее 70 календарных дней с даты заключения Договора**	**40 дней**
1.1.8	**Разработка проектно-сметной документации (Стадия П)**	**Не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора**	**Не позднее 193 календарных дней с даты заключения Договора**	**163 дня**
1.1.9	**Разработка цифровой информационной модели (ЦИМ) Стадия П**	**Не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора**	**Не позднее 193 календарных дней с даты заключения Договора**	**163 дня**
1.1.10	**Экспертиза ПСД**	**Не позднее 193 календарных дней с даты заключения Договора**	**Не позднее 318 календарных дней с даты заключения Договора**	**125 дней**
1.1.11	**Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение)**	**Не позднее 318 календарных дней с даты заключения Договора**	**Не позднее 322 календарных дней с даты заключения Договора**	**4 дня**
1.1.12	**Разработка Рабочей документации**	**Не позднее 109 календарных дней с даты заключения Договора**	**Не позднее 333 календарных дней с даты заключения Договора**	**224 дня**
1.1.13	**Разработка цифровой информационной модели (ЦИМ) Стадия РД**	**Не позднее 109 календарных дней с даты заключения Договора**	**Не позднее 333 календарных дней с даты заключения Договора**	**224 дня**
